

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **1349** del **29 LUG. 2021**

**U.O.C.: PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI TERAMO. CIG: 7636534B34 – CUP: G42C17000180003. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

Data 23.7.2021 Firma

Il Responsabile dell'istruttoria  
Marco Cimini

Data 23.7.2021 Firma

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Ermanno Teseo

Il sostituto del Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.


Data 23.07.2021  
VISTO: Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Giovanni Di Antonio

Firma  
Il sostituto del Direttore UOC Patrimonio,  
Lavori e Manutenzioni  
Ing. Roberto Breda

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29.7.2021



Firma Assente  
Il Direttore Amministrativo:  
dott. Franco Santarelli

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

- favorevole  
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30-07-2021



Firma  
Il Direttore Sanitario:  
Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO  
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO**  
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo  
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

**IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 1306 del 20/08/2018 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.M. 19/03/2015 – Adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) relativo al Presidio Ospedaliero di Teramo e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

**VISTO** il quadro economico complessivo dell'intervento di cui al citato progetto, di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 967.120,92
A1.1	IMPORTI LAVORI CATEGORIA OG1	€ 305.876,69	
A1.2	IMPORTI LAVORI CATEGORIA OS30	€ 685.841,62	
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 24.597,39
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE</b>			<b>€ 991.718,31</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B2	Spese tecniche		
B4.1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 15.867,49
B4.2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.966,87
B7	Imprevisti	5% di A	€ 49.585,92
B9	I.V.A. sui lavori e imprevisti	22% di A+B7	€ 229.086,93
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 298.507,21</b>
<b>A+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 1.290.225,52</b>

**DATO ATTO** che:

- a seguito di procedura di gara, con deliberazione n. 1990 del 06/12/2018, tra l'altro, si disponeva l'affidamento dell'appalto in argomento alla ditta ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo pari a € 674.502,64 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 24.597,39;
- che in data 16/01/2019 veniva stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in argomento, registrato a Teramo in data 31/01/2019, al n. 156 serie 3A;

**PRESO ATTO:**

- del verbale di consegna lavori in data 18/02/2019;
- della concessione di proroga di giorni 180 in data 02/07/2019;
- degli ordini di servizio emessi dalla Direzione dei lavori;

**DATO ATTO** che:

- con Ordinanza n°549 del 12/03/2021 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°1 per un importo, al netto del ribasso offerto, pari a € 211.600,00;
- con Ordinanza n°659 del 02/04/2020 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°2 per un importo, al netto del ribasso offerto, pari a € 206.800,00;
- con Ordinanza n°690 del 23/04/2021 è stato approvato il 3° SAL dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°3 per un importo, al netto del ribasso offerto, pari a € 167.400,00

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";



**RILEVATO** che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie opere sostitutive, aggiuntive e di completamento che hanno reso necessaria la redazione di una Perizia suppletiva e di variante, rimessa in data 22/07/2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Maurizio Baratiri, composta dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa con Quadro economico di variante
- Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi con analisi dei nuovi prezzi
- Computo metrico;
- Quadro comparativo di raffronto;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che *"i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*  
*b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
  - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
  - 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*
- l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che *"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica ..."*;

**VISTO** lo schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 21/07/2021, allegato al presente atto, con cui vengono aggiunte al contratto originario, ulteriori lavorazioni per un importo supplementare pari ad € 102.851,69 oltre IVA, non eccedente la soglia prevista dal sopraccitato comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il seguente quadro economico di variante:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
A1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN VARIANTE	€ 1.107.074,93
A2) RIBASSO D'ASTA 32,8%	€ 363.120,57
A3) IMPORTO LAVORI DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (A1-A2)	€ 743.954,36
A4) COSTI PER LA SICUREZZA	€ 33.399,97
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE DI PERIZIA (A3 + A4)</b>	<b>€ 777.354,33</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1 Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 1,60% di A	€ 15.867,49
B2 Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 0,40% di A	€ 3.966,87
B4 I.V.A. sui lavori 22%	€ 171.017,95
B5 Recupero ribasso	€ 322.018,88
<b>TOTALE "B" SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 512.871,19</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 1.290.225,52</b>

**DATO ATTO** che la perizia di cui sopra:

- non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ermanno Teseo, con la sottoscrizione della relazione e dello schema di atto di sottomissione;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 102.851,69 oltre IVA che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 15,25%;
- non aumenta la spesa prevista dal quadro economico prenotata con Deliberazione n°1621 del 16/10/2018;

**RITENUTO** pertanto di:

- approvare la perizia di variante dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. Mazzini di Teramo composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 102.851,69 oltre IVA;
- prendere atto dello schema di atto di sottomissione in data 21/07/2021, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa Ascani S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 16/01/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 32,8%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire i successivi adempimenti;

#### **PROPONE :**

- 1) di **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. Mazzini di Teramo composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 102.851,69 oltre IVA;
- 2) di **PRENDERE ATTO** dello schema di atto di atto di sottomissione in data 21/07/2021, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa Ascani S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 16/01/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 32,8%;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria all'intervento in argomento trova capienza nell'autorizzazione 2021/1/41, come da schema finanziario del presente atto;
- 4) di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

#### **DELIBERA**

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Maurizio Di Giosia**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name of the Director General, Maurizio Di Giosia.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.



ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

---

Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati alla presente deliberazione sono costituiti da n. 15 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Relazione tecnica illustrativa (pagg. 5)

Allegato n. 2 – Schema atto di sottomissione (pagg. 10)

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Ermanno Teseo





A handwritten signature in blue ink.

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO**  
**C.ne Ragusa 1, 64100 Teramo**

**OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI TERAMO.**

**CIG: 7636534B34 – CUP: G42C17000180003 – RDO MEPA NR. 2070075**

**DITTA: ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI srl** con sede legale in Via Frana n°26 Grottamare (AP), P.I. 01852300449 – nuova intestazione comunicata via PEC con denominazione variata in ASCANI srl

**Deliberazione n.1306 del 20 AGOSTO 2018 – D.M. 19 MARZO 2015.** Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Teramo

**Deliberazione n.1990 del 06 DICEMBRE 2018 – D.M. 19 MARZO 2015.** Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Teramo

\*\*\*\*\*

Importo lavori: a base di contratto €. 674.502,64 oltre IVA come per legge compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 24.597,39

Contratto in data 16.01.2019 n° 156 serie IIIA di rep. Registrato in Teramo il 31.01.2019.

\*\*\*\*

*Responsabile del Procedimento: Ing. Ermanno Teseo*

*Direzione dei Lavori:*

*Dirig. Ing. Maurizio Baratiri*

**RELAZIONE TECNICA**  
**PERIZIA DI VARIANTE**



## MOTIVAZIONI TECNICHE E SCELTE PROGETTUALI:

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare la perizia di variante al progetto dei lavori di **Adeguamento antincendio relativi alle norme di prevenzione incendi del P.O. "G.Mazzini" di Teramo AUSL Teramo** - Tale variante è stata redatta con lo scopo di definire correttamente l'intervento in oggetto, in virtù delle sopraggiunte necessità e modifiche di dettaglio degli impianti e delle correlate necessità di modifiche riportate negli Ordini di Servizio n°01-02-03-04-05 che sono parte integrante della presente Perizia di Variante.

Tutti gli interventi realizzati rientrano nell' Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 Comma 1, lettera b) incidono per una percentuale sull'importo contrattuale che nello specifico risulta essere pari ad un aumento del **15.2%**.

Tutto quanto sopra premesso, si giunge ad un nuovo quadro economico di seguito **in allegato "C"** che va a sostituire il quadro economico di affidamento **in allegato "B"**.

Il tempo utile per la riconsegna dei lavori, in considerazione della presente Perizia di Variante e delle Concessioni di Proroghe n° 01- 02 – 03 – 04 intervenute anche a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica, è la data di scadenza fissata per il 30/09/2021, dalla consegna dei lavori avvenuti in data 18/02/2019.


Inoltre vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elaborato "schema dell'atto di sottomissione".

**A conclusione di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all'approvazione della citata Perizia di Variante n. 1**

La Ditta  
**ASCANI Srl**  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

  
**Ascani**  
Via Lame 1113  
63066 GROTTAMMARE (AP)  
CF - PI. 01852300449 - Cod. SDI: SUBM79H

**Il Direttore dei Lavori**  
Ing. Maurizio Baratiri

  
Il Dirigente  
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni  
Ing. Maurizio Baratiri

Si Autorizza  
**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Ermanno TESEO





**Allegato "A" – Quadro Economico di Progetto**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO al netto degli oneri		€. 967.120,92
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€. 24.597,39
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE</b>			<b>€. 991.718,31</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 15.867,49
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.966,87
B3	Imprevisti	5% di A	€ 49.585,92
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A+B3	€ 229.086,93
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 298.507,21</b>

**AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**

<b>A+B</b>		<b>€ 1.290.225,52</b>
------------	--	-----------------------



**Allegato "B" – Quadro Economico di Affidamento**

**QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO**

A		LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€. 967.120,92
	RIBASSO D'ASTA 32.8%		-€. 317.215,66
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€. 649.905,25
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€. 24.597,39
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE</b>			<b>€. 674.502,64</b>

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 15.867,49
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 3.966,87
B3	Imprevisti	5% di A1+A2	€ 49.585,92
B4	I.V.A. sui lavori ed imprevisti	22% di A+B3	€ 159.299,48
B5	Residui da ribasso		€ 387.003,11
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 615.722,88</b>

**AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**

A+B		€ 1.290.225,52
-----	--	----------------



**Allegato "C" – Quadro Economico Perizia di Variante**

**QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE**

A		LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE		€ 1.107.074,93
	RIBASSO D'ASTA 32.8%		-€ 363.120,57
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 743.954,36
4A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 33.399,97
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE</b>			<b>€ 777.354,33</b>

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 15.867,49
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 3.966,87
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A	€ 171.017,95
B5	Residui da ribasso		€ 322.018,88
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 512.871,19</b>

**AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**

A+B		€ 1.290.225,52
-----	--	----------------

La Ditta  
**ASCANI Srl**  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**Il Direttore dei Lavori**  
Ing. Maurizio Baratiri

Il Dirigente  
U.O. Patrimonio Lavori e Manutenzioni  
Ing. Maurizio Baratiri

**Ascani**  
Via Lame 113  
03066 GROTTAMMARE (AP)  
Tel. +39 085230449 - C.F. 03015080429


**VISTO**  
**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Ermanno TESEO







A handwritten signature or mark in the bottom left corner, consisting of several loops and a tail.

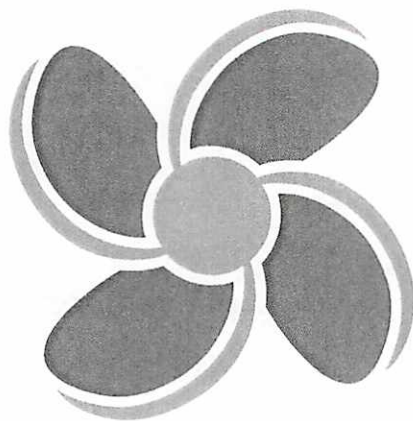

**ASL**  
**TERAMO**

www.aslteramo.it

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO**  
**C.ne Ragusa 1, 64100 Teramo**

**OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI TERAMO.**

CIG: 7636534B34 – CUP: G42C17000180003 – RDO MEPA NR. 2070075

**DITTA: ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI srl** con sede legale in Via Frana n°26 Grottamare (AP), P.I. 01852300449 – nuova intestazione comunicata via PEC con denominazione variata in ASCANI srl

**Deliberazione n.1306 del 20 AGOSTO 2018** – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Teramo

**Deliberazione n.1990 del 06 DICEMBRE 2018** – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Teramo

\*\*\*\*\*

Importo lavori: a base di contratto €. 674.502,64 oltre IVA come per legge compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 24.597,39


Contratto in data 16.01.2019 n° 156 serie IIIA di rep. Registrato in Teramo il 31.01.2019.

\*\*\*\*

Responsabile del Procedimento: **Ing. Ermanno Teseo**

Direzione dei Lavori:

**Dirig. Ing. Maurizio Baratiri**

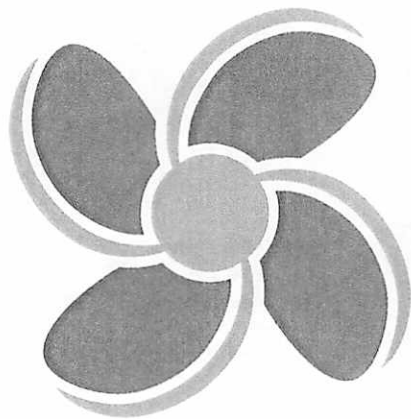

**ASL**  
**TERAMO**  
www.aslteramo.it


**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON  
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

**Premesso:**

- la **Delibera n.1306 del 20 AGOSTO 2018** – Approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Teramo
- che con **Delibera n.1990 del 06 DICEMBRE 2018**, con la quale si sono appaltati i lavori in argomento alla **Ditta Ascani Impianti e Costruzioni Srl** c con sede legale in Via Frana n°26 Grottamare (AP), **P.I. 01852300449**, a seguito di procedura negoziata e con un ribasso del 32.8% sull'importo lordo, determinando un importo lavori pari ad **€. 674.502,64 €** (Euro seicentostettantaquattromilacinquecentodieci/64) compresi oneri per la sicurezza pari ad **€. 24.597,39** (Euro ventiquattromilacinquecentonovantasette/39).
- che i lavori sono stati consegnati in data 18.02.2019;
- che in fase di affidamento si è riscontrata la necessità di effettuare delle modifiche impiantistiche ed edili, previsti nel contratto di appalto, con altri i cui prezzi unitari, per la relativa contabilizzazione, sono mancanti;
- che a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid 19 sono intervenute necessarie sospensioni dei lavori;
- che a seguito della presente Perizia di Variante, l'importo dei lavori da eseguire varia da **€. 674.502,64** (importo contrattuale) a **€. 777.354,33** (importo di variante) oltre a IVA, ma compreso Oneri per la Sicurezza, per un maggiore importo al netto di **€. 102.851,69** con un aumento del **15.2%**;

**TUTTO CIO' PREMESSO**



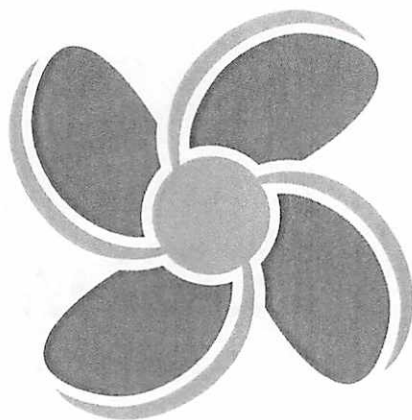

**ASL**  
**TERAMO**  
www.aslteramo.it

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 21 del mese di Luglio in Teramo, tra i sottoscritti, Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Baratiri ed il Sig. Mario Ascani in qualità di legale rappresentante della Ditta ASCANI Srl, si stabilisce quanto segue:

**Art. 1**

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella presente perizia e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori variativi e le relative nuove categorie contemplate in detta perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto, di cui al quadro economico di aggiudicazione (allegato "A"), e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati; la suddetta ditta si impegna inoltre a rispettare l'importo complessivo dei lavori come da quadro economico variante (allegato "B"), rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.



**Art. 2**


I lavori oggetto del presente atto di sottomissione avverranno a saldo ed unica soluzione all'emissione dello Stato Finale Lavori e CRE, e comunque secondo le modalità previste dal Capitolato Generale allegato al contratto principale.

**Art. 3**

Data la natura delle opere determinate dalla presente perizia, il tempo utile, per l'ultimazione dei lavori è stato oggetto di concessioni di proroga n°01-02-03-04 a seguito delle sospensioni e problematiche dovute all'emergenza sanitaria epidemiologica ancora in corso, e comunque concessa la scadenza contrattuale fino alla scadenza del 30 settembre 2021.

**Art. 4**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

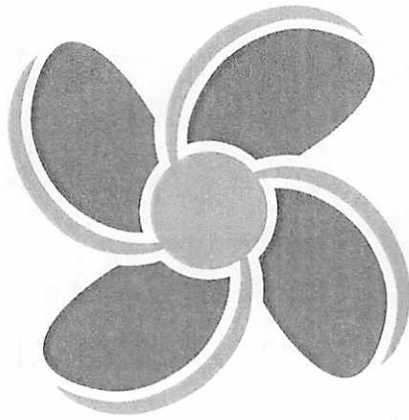

**ASL**  
**TERAMO**  
www.aslteramo.it

**Art. 5**

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi è di € **102.851,69** (centodueottocentocinquantunoeuro/69) oltre iva, come rilevato da computo metrico allegato.

**Art. 6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 D.M. n°49 del 07/03/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elaborato denominato "**concordamento elenco nuovi prezzi**".

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

La Ditta  
**ASCANI Srl**  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**Ascani**  
Via Lame 113  
63066 GROTTAMMARE (CB)  
CF. PI. 0185200749 - C.A.B. 50150870709


**Il Direttore dei Lavori**

Ing. Maurizio Baratiri

Il Dirigente  
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni  
Ing. Maurizio Baratiri

Si Autorizza  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Ermanno TESEO



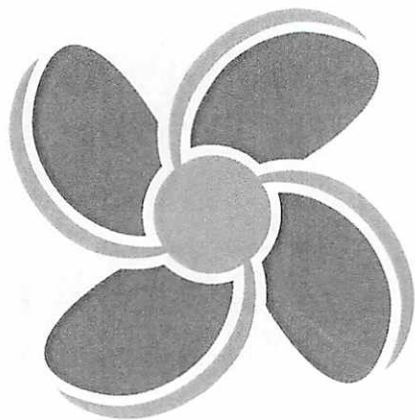

**ASL**  
**TERAMO**  
www.aslteramo.it

## Allegato "A" – Quadro Economico di Affidamento

### QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€. 967.120,92
	RIBASSO D'ASTA 32.8%		-€. 317.215,66
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€. 649.905,25
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€. 24.597,39
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€. 674.502,64


B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 15.867,49
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 3.966,87
B3	Imprevisti	5% di A1+A2	€ 49.585,92
B4	I.V.A. sui lavori ed imprevisti	22% di A+B3	€ 159.299,48
B5	Residui da ribasso		€ 387.003,11
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 615.722,88

### AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 1.290.225,52
-----	--	----------------





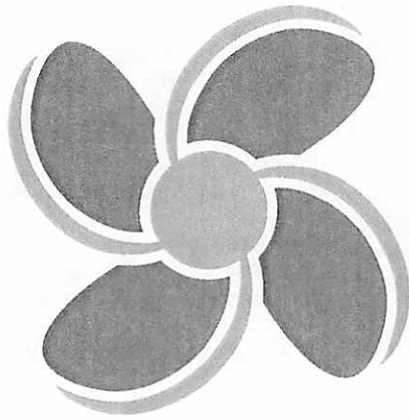

**ASL**  
**TERAMO**  
www.aslteramo.it

**Allegato "B" – Quadro Economico di Perizia di Variante**

**QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE**


<b>A</b>		<b>LAVORI</b>	
A1	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE		€ 1.107.074,93
	RIBASSO D'ASTA 32.8%		-€ 363.120,57
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 743.954,36
4A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 33.399,97
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE</b>			<b>€ 777.354,33</b>

<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 15.867,49
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 3.966,87
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A	€ 171.017,95
B5	Residui da ribasso		€ 322.018,88
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 512.871,19</b>

<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	
<b>A+B</b>	<b>€ 1.290.225,52</b>

**Il Direttore dei Lavori**  
**Ing. Maurizio Baratin**  
Il Dirigente  
U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Ing. Maurizio Baratin


**CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

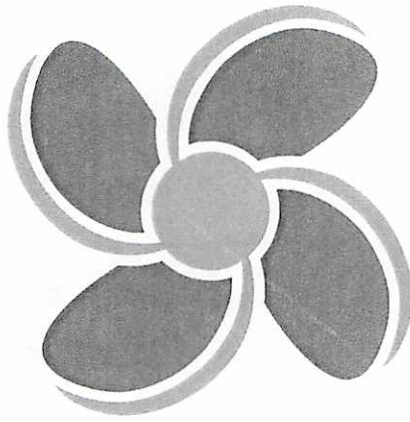

Num. Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.001.070.10 0.b	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su muratura di tufo, mattoni e simili- diametro foro da 70 a 100 mm euro (settantaotto/60)	m	78,60
Nr. 2 E.018.040.01 0.e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm euro (quattrocentoquattordici/13)	cad	414,13
Nr. 3 E.018.040.01 0.e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm euro (quattrocentoquattordici/13)	cad	414,13
Nr. 4 E.018.040.01 0.f	idem c.s. ...antipanico- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm euro (quattrocentotrentadue/60)	cad	432,60
Nr. 5 E.018.040.01 0.g	idem c.s. ...antipanico- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm euro (quattrocentoquarantasette/72)	cad	447,72
Nr. 6 E.018.040.01 0.g	idem c.s. ...antipanico- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm euro (quattrocentoquarantasette/72)	cad	447,72
Nr. 7 E.018.040.02 0.e	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm euro (quattrocentosettantaquattro/52)	cad	474,52
Nr. 8 E.018.040.02 0.e	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm euro (quattrocentosettantaquattro/52)	cad	474,52
Nr. 9 E.018.040.02 0.f	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm euro (cinquecentodue/24)	cad	502,24
Nr. 10 E.018.040.02 0.g	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm euro (cinquecentoventisette/75)	cad	527,75
Nr. 11 E.018.040.02 0.h	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm euro (seicentoventiquattro/24)	cad	624,24
Nr. 12 E.018.040.03 0.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm euro (settecentoquindici/03)	cad	715,03
Nr. 13 E.018.040.03 0.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm euro (settecentoquindici/03)	cad	715,03






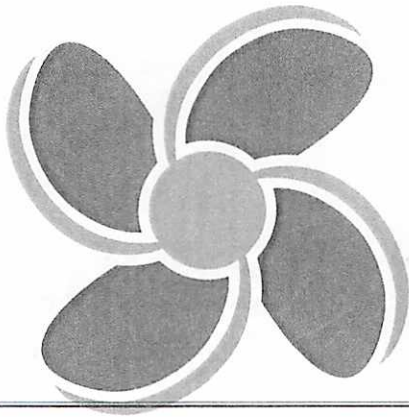

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 E.018.040.04 0.k	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm <b>euro (ottocentocinquante/03)</b>	cad	825,03
Nr. 15 E.018.040.04 0.m	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm <b>euro (ottocentoquarantasei/65)</b>	cad	846,65
Nr. 16 E.018.040.04 0.o	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm <b>euro (ottocentonovantacinque/77)</b>	cad	895,77
Nr. 17 E.018.040.04 0.o	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm <b>euro (ottocentonovantacinque/77)</b>	cad	895,77
Nr. 18 E.018.040.04 0.p	idem c.s. ...antipanico- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm <b>euro (novecentoquarantasei/39)</b>	cad	946,39
Nr. 19 E.018.040.13 0.a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna <b>euro (centosessantasette/57)</b>	cad	167,57
Nr. 20 EL.020.010.0 50.c	Tube per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestingente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 25 <b>euro (tre/80)</b>	m	3,80
Nr. 21 EL.020.020.0 10.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assim. a mm 90x90x50 <b>euro (nove/05)</b>	Cad	9,05
Nr. 22 EL.020.020.0 10.c	idem c.s. ...a mm 155x140x55 <b>euro (dodici/76)</b>	Cad	12,76
Nr. 23 EL.020.020.1 30.a	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - elemento rettilineo mm 60x40 <b>euro (quattordici/10)</b>	m	14,10
Nr. 24 EL.020.020.1 30.t	idem c.s. ...MULTIFUNZIONALE - angolo interno o esterno mm 60x40 <b>euro (otto/01)</b>	Cad	8,01
Nr. 25 EL.020.020.1 30.z27	idem c.s. ...MULTIFUNZIONALE - scatola di derivazione h: mm 120 <b>euro (trentauno/20)</b>	Cad	31,20
Nr. 26 EL.020.020.1 30.z28	idem c.s. ...MULTIFUNZIONALE - separatore mm 40 <b>euro (tre/40)</b>	Cad	3,40
Nr. 27 EL.020.020.1 30.z35	idem c.s. ...MULTIFUNZIONALE - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60 <b>euro (trentasei/66)</b>	m	36,66
Nr. 28 EL.020.020.1 40.c	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO - 30x10 mm <b>euro (sette/87)</b>	m	7,87
Nr. 29 EL.020.020.1 40.j	idem c.s. ...PLASTICO - angolo, giunto o derivazione 30x10 mm <b>euro (tre/06)</b>	Cad	3,06
Nr. 30 NP01010	FPO di Saliscendi REI 120 interbloccato elettricamente 1000x1000, applicazione su muratura, coppia contrappressi, anta e guida laterali, copriguida e distanziali, una fune per anta, guarnizione termo- espandente. marcatura CE, verniciatura portone colore RAL 1013 Dispositivo di sblocco, pulsante attivazione allarme. <b>euro (seimilasettecentocinquante/00)</b>	cadauno	6'752,00
Nr. 31 NP1000	Fornitura e posa in opera di serratura elettrica <b>euro (cinquecentotrenta/24)</b>	cadauno	530,24



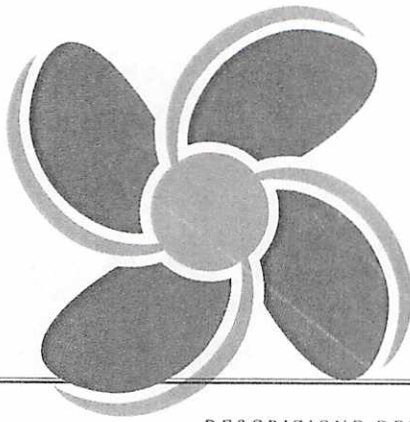

# ASL TERAMO


www.aslteramo.it

pag. 4

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 NP1001	Fornitura e posa in opera di scheda addizionale per Centrale euro (novecentottantaotto/84)	cadauno	988,84
Nr. 33 NP1002	Fornitura e posa in opera di Centrale Audio euro (centocinquantamilacentoventotto/94)	a corpo	150'128,94
Nr. 34 NP1003	Cavo FG4OHM1 PH30 2x1,5mmq euro (tre/41)	m	3,41
Nr. 35 NP1004	Cavo FTE4OM1 2x1,5mmq euro (tre/48)	m	3,48
Nr. 36 NP1005	idem c.s. ...Cavo FTE4OM1 2x2,5mmq euro (tre/79)	m	3,79
Nr. 37 NP1006	Controsoffitto 600x600 Classe A1:Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli in lana di roccia 600x600 in appoggio, spessore 12mm, Classe A1, maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. euro (novantacinque/86)	m2	95,86
Nr. 38 NP1007	Led Panel 38-40W da installare nel controsoffitto:Fornitura e posa in opera di Panel Led 38-40W da appoggio su controsoffitto 600x600, IP40 3800lumen. Accessori e minuterie per dare il lavoro finito. euro (centoquarantanove/80)	m2	149,80
Nr. 39 NP1008	Interventi su infissi esistenti e/o realizzazione di nuovi presso EMODINAMICA LOTTO 2 PIANO SEMINTERRATO:Interventi su infissi esistenti e/o realizzazione di nuovi e precisamente: n.2 porte in alluminio 215x218cm, profilati serie R40 realizzate con due specchiature fisse ai lati e due ante apribili, incluso n.2 maniglioni antipanico tipo Push ad un punto di chiusura, chiudiporta aereo, completo di vetro visarm 8/9 satinato, il tutto previa rimozione delle esistenti, carico e trasporto a rifiuto compreso oneri per lo smaltimento (infisso A e B) Applicazione di n.2 maniglioni antipanico tipo Push ad un punto di chiusura e incontro elettrico su infisso esistente a due ante, incluso la sostituzione della fascia centrale dell'anta (infisso C). n.1 porta in alluminio 125x214cm, profilati serie R40 realizzate con due ante apribili, incluso n.2 maniglioni antipanico tipo Push ad un punto di chiusura, completo di vetro visarm 8/9 satinato, il tutto previa rimozione delle esistenti, carico e trasporto a rifiuto compreso oneri per lo smaltimento (infisso D) Applicazione di n.2 maniglioni antipanico tipo Push ad un punto di chiusura su infisso esistente a due ante, incluso la sostituzione della fascia centrale dell'anta (Infisso. E) euro (dicianovemiladuecentosettantasette/08)	a corpo	19'277,08
Nr. 40 NP1009	Intervento pneumologia toracica come da richiesta urgente della DS di presidio nel periodo di Agosto: Intervento straordinario pd'urgenza presso il reparto di pneumologia toracica dal 3° piano, per le seguenti opere: Rimozione di parete in profili di alluminio e vetro, compreso il carico e lo smaltimento dal 3° piano; Realizzazione di parete divisoria rei 120 a n. 4 lastre di cartongesso su struttura da 75 ( L 4,43 x H 3,18), compreso: il trasporto dei materiali al 3° piano, la stuccatura, la rifinitura e carteggiatura; Tinteggiatura della parete nei colori esistenti, compreso la zoccolatura sul lato corridoio e lato parete. Adeguamento dell'impianto elettrico, accessori e minuterie per dare il lavoro finito. Compresi oneri per lo smaltimento del materiale rimosso. euro (seimilaseicentonovantasei/00)	a corpo	6'696,00
Nr. 41 NP2001	Opere provvisoriale e di messa in sicurezza degli impianti elettrici esistenti per l'applicazione di placcaggi su pareti e/o soffitto. Le attività comprendono lo scollegamento provvisorio di scatole portafuoco di derivazione corpi illuminanti, e/o apparecchiature impianti speciali. Successivo collegamento e test di funzionamento. Sono compresi tutti gli accessori e le minuterie per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante secondo le regole dell'arte. euro (trentaquattro/16)	cadauno	34,16
Nr. 42 NP2002	Opere di intervento all'impianto elettrico normale e di rilevazione incendi già realizzati in corso d'opera, non prevedibili e causati da imprevisti in corso d'opera, oltre che per l'emergenza Covid. Spostamento magazzino di cantiere periodo emergenza covid per mancanza di spazi (40h x2 persone). Rimozione impianto seminterrato lotto 1 per passaggio macchinario RMN (4h*2p). Spostamento canaline, rilevatori e dispositivi già installati nel reparto ex trasfusionale divenuto dopo cantiere Psichiatria e pertanto da adeguare alla messa in sicurezza da cavi e fonti di rischio per l'incolumità dei pazienti (70h x 2 persone). Spostamento punto luce e rilevatori nuovi depositi ed al corridoio del piano 5 Medicina (4 h x 2 persone). Spostamento rilevatore di fumo degenza P5 per posa corpo illuminante 1h x 2 persone) Accessori e minuterie varie per dare il lavoro completo e ripristinato. euro (ottomiladuecentoquarantauno/92)	cadauno	8'241,92
Nr. 43 R.010.010.01 0.a	Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idoneo nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta, realizzazione, ove occorra di telai/strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica, affissione di cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: confinamento statico degli ambienti di lavoro euro (ventisei/06)	m²	26,06

Data, 15/07/2021

Il Tecnico

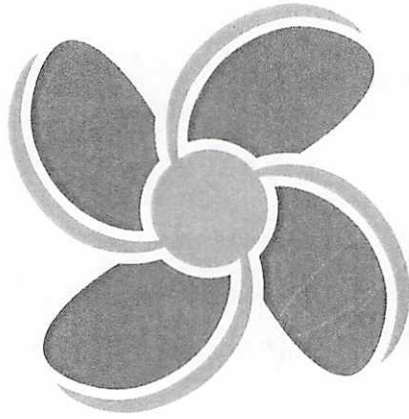

# ASL TERAMO

www.aslteramo.it

La Ditta  
**ASCANI Srl**  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**Ascani**  
Via Lave 113  
63066 GROTTAMMARE (AP)  
CF. PI.01857000429 - Cod. Fisc. 01857000429

**Il Direttore dei Lavori**

**Ing. Maurizio Barattini**

Il Dirigente  
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni  
Ing. Maurizio Barattini

**VISTO**

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Ermanno TESEO**



(proponente)  
UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2021 € ----- sottoconto 1 1 2 03 02 00  
Manut.e rip.strao.capital.fabbr.indisp

autorizzazione 2021/1/41 (ex prenotazione 1888/21)

Fonte di finanziamento: F.S.N.

Data 23.07.2021

Il Dirigente

Ing. Roberto Breda

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2021.

Data: 16-9-2021

Il Contabile

Il Dirigente

ASL 4 TIRAMO  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 30 LUG. 2021 con prot. n. 2574/26 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma \_\_\_\_\_  
L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
